

PLANNING DE RÉALISATION

Réalisation des travaux d'un pôle médical

INFORMATIONS DU PROJET

Objet : Planning de réalisation — Pôle médical

Délai d'exécution : À partir de l'ODS notifié au service
co-contractant par le service contractant

Version 1 : Délai de 24 mois

Version 2 : Délai optimisé de 16 mois ($\times 0.667$)

Date du document : 28/06/2026

DOCUMENT CONFIDENTIEL — USAGE INTERNE

Diagramme de Gantt — Version 16 Mois

Le diagramme ci-dessous présente le planning de réalisation recalculé sur 16 mois (facteur de compression $\times 0.667$ appliqué à toutes les durées et dates de début par rapport à la version originale de 24 mois).

Délai d'exécution : À partir de l'ODS notifié au service co-contractant par le service contractant.

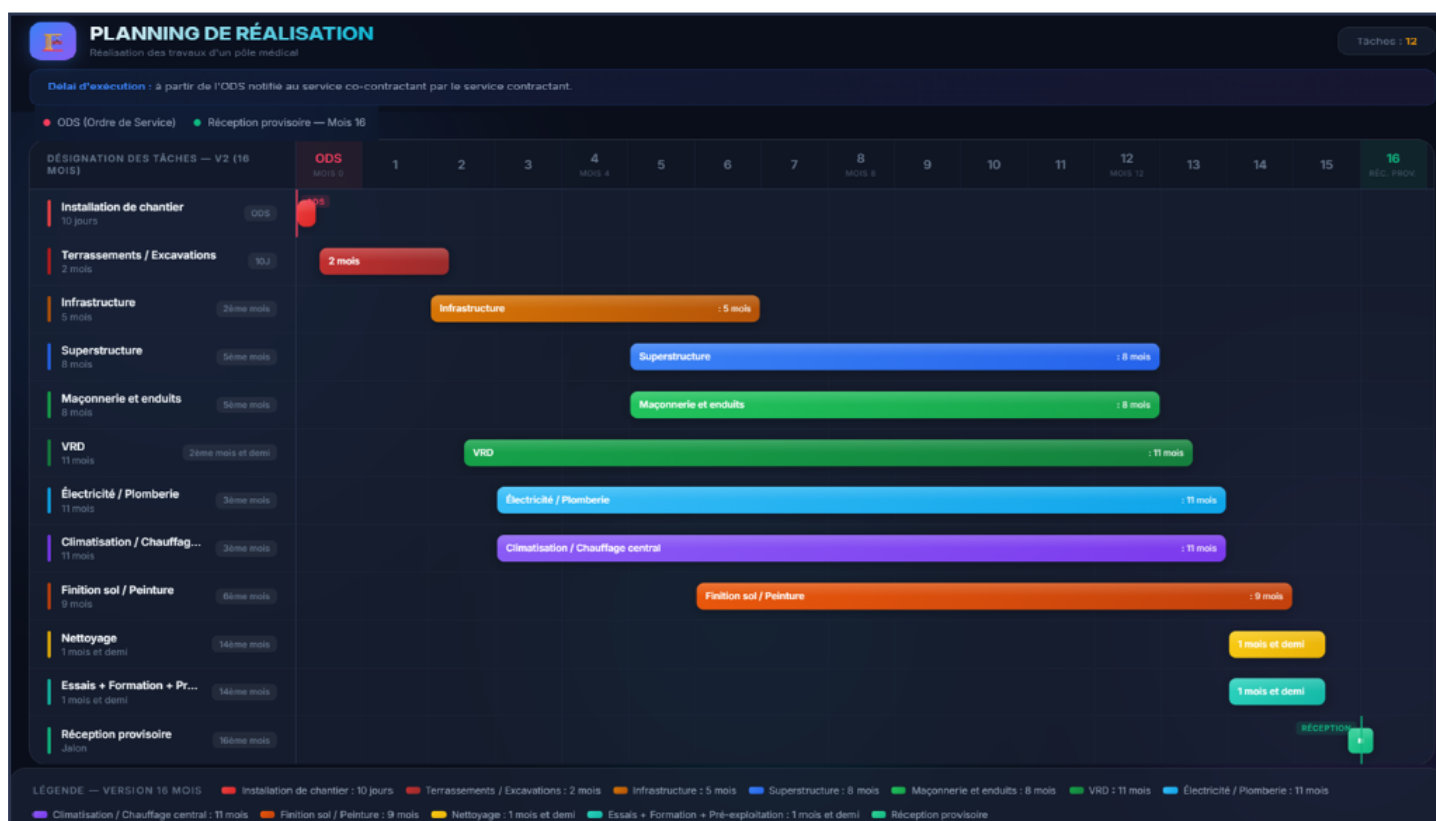


Figure 1 — Diagramme de Gantt interactif, version 16 mois (capture écran)

Récapitulatif des tâches

Comparaison des durées entre la version 24 mois et la version optimisée 16 mois.

#	Tâche	V1 (24 mois)		V2 (16 mois)	Début V2
1	Installation de chantier	15 jours	→	10 jours	M0
2	Terrassements / Excavations	3 mois	→	2 mois	10J
3	Infrastructure	7 mois	→	5 mois	M2
4	Superstructure	12 mois	→	8 mois	M5
5	Maçonnerie et enduits	12 mois	→	8 mois	M5
6	VRD	17 mois	→	11 mois	M2½
7	Électricité / Plomberie	17 mois	→	11 mois	M3
8	Clim / Chauffage central	16 mois	→	11 mois	M3
9	Finition sol / Peinture	13 mois	→	9 mois	M6
10	Nettoyage	2 mois	→	1 mois ½	M14
11	Essais + Formation	2 mois ½	→	1 mois ½	M14
12	Réception provisoire	Mois 24	→	Mois 16	M16

Note :

Le facteur de compression $\times 0.667$ (16/24) a été appliqué uniformément à toutes les durées et dates de début.
